

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

REALIZAÇÕES 2021-2024 / DESAFIOS 2025-2028



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

GESTÃO  
21-24

**Resumo das principais ações da SIURB entre os anos de 2021 a 2024**

GESTÃO  
25-28

**Resumo das principais ações da SIURB previstas para os anos de 2025 a 2028**

Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR  
Plano Diretor de Drenagem – PDD  
Programa de recuperação de Pontes e Viadutos  
Intervenções viárias

Operações Urbanas  
Educação  
Novas atas

100 DIAS

**Principais ações previstas para os 100 primeiros dias da nova gestão**

MULHERES NA  
CONSTRUÇÃO

**Programa de empreendedorismo para mulheres na construção civil**

DEBATE

**Discussão sobre pontos importantes**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

# GESTÃO 2021-2024



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**GESTÃO  
21-24**

## DRENAGEM



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Drenagem e áreas de risco**

A SIURB deu início à 110 obras em áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil, sendo 81 concluídas e outras 29 entregues em breve

### **Canalizações, contenções e galerias**

Foram 42,7 mil metros de margens de córregos, galerias e taludes recuperados. Enquanto que outros 9,2 mil metros estão em andamento

### **Reservatórios**

- Entregues: 3
- Em obras: 8
- Contratados: Paraguai-Éguas, Moema e Zavuvus
- Em licitação: Rio Verde e Obelisco

**GESTÃO  
21-24**

**EDUCAÇÃO**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**Novas escolas**

27 unidades entregues

**Reformas de escolas**

682 entregues

**Reforma de CEUs**

26 entregues

**Planetários**

Planetário do CEU Parelheiros entregue

**Cobertura de quadras**

100 coberturas entregues

**GESTÃO  
21-24**

## MOBILIDADE



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **OAEs**

- Estão em andamento obras em 139 estruturas em toda a cidade. Entre 2021 e 2024, foram concluídas 183 obras
- Viaduto Santa Ifigênia
- Ciclop passarela Bernardo Goldfarb
- Viaduto João Beizola
- Ponte Jurubatuba
- Ligação Viária Pirituba Lapa
- Ligação viária Graúna Gaivotas

### **Corredores/Terminais**

- Retomada das obras do Terminal Itaquera
- Av. Santo Amaro
- Requalificação dos corredores Amador Bueno da Veiga, Imirim, Interlagos e Itapeceira
- BRTs: Radial / Aricanduva

### **Viário**

- Retomada das obras de prolongamento da Av. Chucri Zaidan (obra em andamento)
- Requalificação dos calçadões do Triângulo Histórico (obra em andamento)
- Requalificação dos calçadões da República (licitação publicada)

**GESTÃO 2025-2028**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS



# INVESTIMENTO LOA 2025



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**LOA 2025 SIURB:** Lei Orçamentária Anual aprovada pela Câmara Municipal. Aproximadamente R\$ 3 bilhões.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Mobilidade</b>      | R\$ 1.132.175.361,00 |
| <b>Drenagem</b>        | R\$ 693.155.534,00   |
| <b>Viário</b>          | R\$ 21.831.000,00    |
| <b>OAEs</b>            | R\$ 1.071.509.857,00 |
| <b>Custeio</b>         | R\$ 69.406.742,00    |
| <b>Outros Projetos</b> | R\$ 11.541.388,00    |



**GESTÃO  
25-28**

## PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Licitações**

A previsão é que as obras prioritárias sejam contratadas no primeiro semestre de 2025. Para o primeiro bloco de obras, estima-se um investimento de R\$ 1,5 bilhão.

### **Investimentos**

- Entre R\$ 17bi e R\$ 28 bi em 16 anos
- Contenções e canalizações representam entre 15% e 30% do todos os investimentos no horizonte de 16 anos
- Novas moradias entre 15% e 30% do investimento previsto
- Urbanismos social entre 30% e 50% do investimento previsto
- Ações de monitoramento entre 2% e 3% do investimento previsto

### **Abrangência**

É um plano dinâmico e contínuo, aplicado a todas as áreas de risco do município.



# PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR



As intervenções do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) foram elencados a partir de um sistema de hierarquização. O sistema leva em consideração nove critérios diferentes.

| Critério                           | Nível                                       | Peso | Total |
|------------------------------------|---|------|-------|
| Projeto                            | <12 meses                                   | 25   | 25    |
|                                    | >12 meses                                   | 10   |       |
|                                    | Sem projeto                                 | 0    |       |
| Moradias em área R3/R4             | Sem moradores                               | 0    | 20    |
|                                    | <100  | 5    |       |
|                                    | 101 a 500                                   | 10   |       |
| IPVS                               | >500  | 20   | 10    |
|                                    | -1 a 1                                      | 0    |       |
|                                    | 2 a 4                                       | 5    |       |
| Ação Judicial                      | 5 a 6                                       | 10   | 5     |
|                                    | Inexistente/Não informado                   | 0    |       |
|                                    | Em curso                                    | 1    |       |
|                                    | Condenação R1/R2                            | 2    |       |
| Intervenção Pre-gressa             | Condenação R3/R4                            | 5    | 5     |
|                                    | Inexistente                                 | 5    |       |
| Orçamento                          | Existente                                   | 0    | 20    |
|                                    | <10 MM                                      | 20   |       |
|                                    | 10 a 50 MM                                  | 10   |       |
| Licenciamento                      | >50 MM                                      | 5    | 5     |
|                                    | Sim/ND                                      | 0    |       |
| Necessidade de Remoção de Moradias | Não   | 5    | 5     |
|                                    | < 6.000 m <sup>2</sup>                      | 5    |       |
|                                    | 6.001 m <sup>2</sup> a 15000 m <sup>2</sup> | 2    |       |
| Ocorrências                        | >15000 m <sup>2</sup>                       | 0    | 5     |
|                                    | Sim   | 5    |       |
|                                    | Não   | 0    |       |


GESTÃO  
25-28

# PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

Foram elencadas 121 áreas prioritárias (bloco 1), que já contam com projetos desenvolvidos, em elaboração ou contratados. Os demais projetos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma de implementação do PMRR, que se estende por 4 quadriênios.

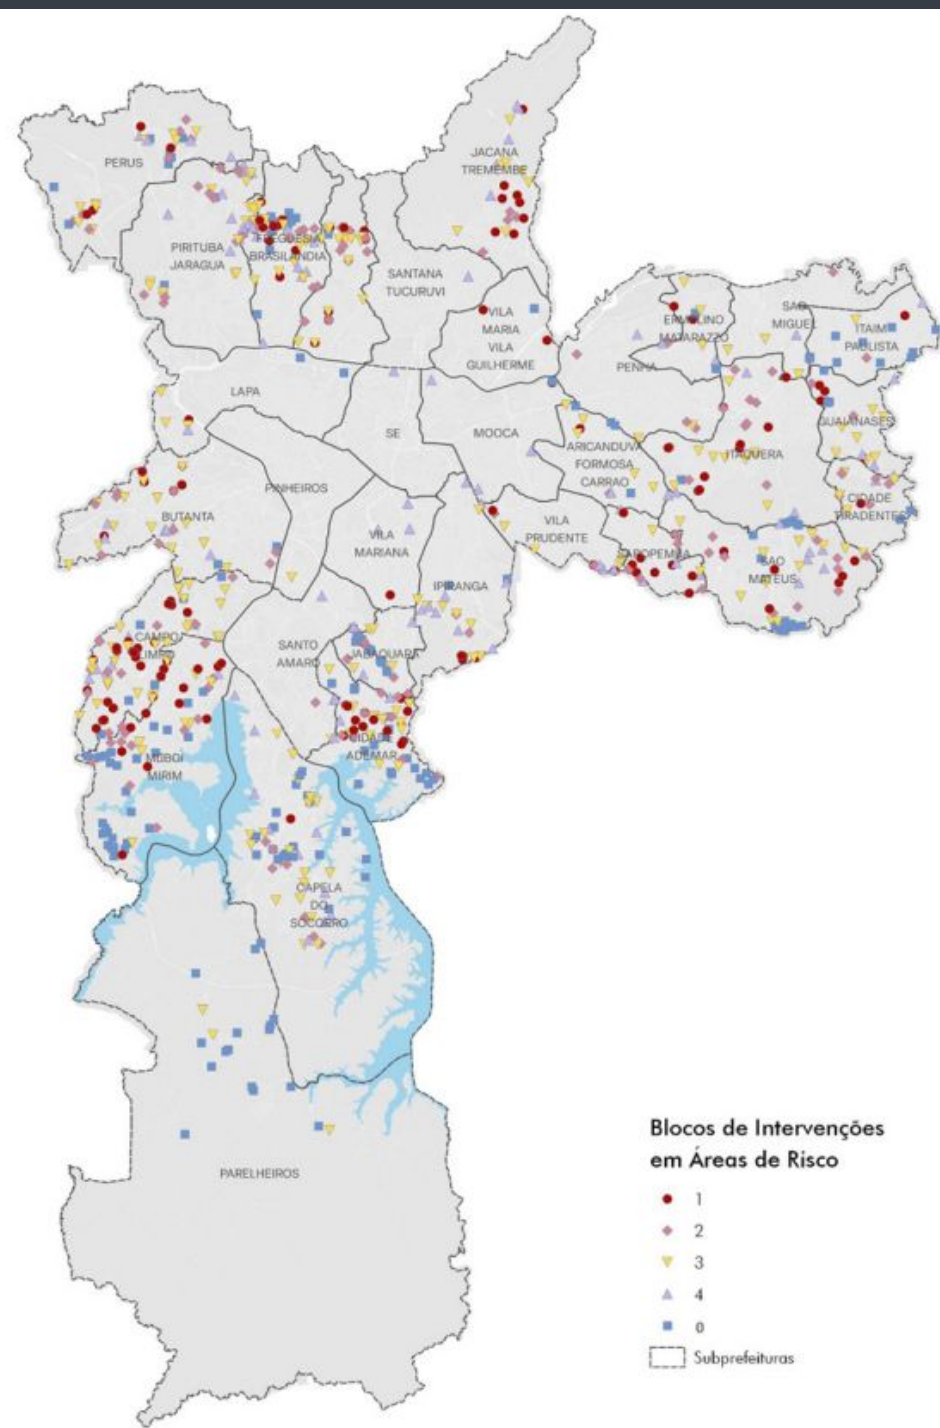



# PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PMRR



**CIDADE DE SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

O PMRR não se resume a obras para mitigação de risco. O Plano de Ações do PMRR é composto por 20 itens, e sua execução visa mitigar e monitorar os riscos nas áreas existentes, bem como prevenir o surgimento de novas áreas de risco.

| Ação  | Valor referencial (milhões)   | Prazo Proposto  |
|---|---|-----------------|
| I Criação de uma meta Governamental   | Não possui custos   | 1 Quadriênio    |
| II Criação de Estrutura Orçamentária para Captação de Recursos                        | Não possui custos   | 1 Quadriênio    |
| III Criação do Conselho Gestor para Contratação de Projetos e Obras em Áreas de Risco | Não possui custos   | 1 Quadriênio    |
| IV Aprimoramento do Fluxo Processual  | < 5 milhões por ano   | 1 Quadriênio    |
| V Atualização das Diretrizes de Projeto de Drenagem e Contenção                       | 1-2 milhões   | 1 Quadriênio    |
| VI Monitoramento e Hierarquização Contínua das Áreas                                  | 5-10 milhões para implementação + 5-10 milhões por ano para sustentação         | 1 Quadriênio    |
| VII Atualização e Aprovação do PMH  | <20 milhões   | 1 Quadriênio    |
| VIII Obras Mitigação de Risco   | -11 bilhões   | 1-4 Quadriênios |
| IX Medidas Práticas para Evitar a Reocupação  | 2-5 milhões para implementação + <3 milhões por ano para sustentação            | 1 Quadriênio    |
| X COI-SP  | 50-100 milhões para implementação + 20-50 milhões por ano para sustentação      | 1 Quadriênio    |
| XI Sensores para Monitoramento da Movimentação de Encostas                            | 5-20 milhões por ano para implementação + 5-10 milhões por ano para sustentação | 1-2 Quadriênios |
| XII Aprimoramento da rede de telemetria dos Rios e Canais                             | 5-10 milhões para implementação + 2-5 milhões por ano para sustentação          | 1 Quadriênio    |
| XIII Ações Educativas e de Treinamento  | < 5 milhões por ano   | 1-4 Quadriênios |
| XIV Sistema de Alerta e Sirenes   | 2-5 milhões para implementação + <3 milhões por ano para sustentação            | 1-4 Quadriênios |
| XV Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos nas Áreas de Risco                     | < 5 milhões por ano   | 1 Quadriênio    |
| XVI Sensoreamento da Rede de microdrenagem  | 5-20 milhões para implementação + 5-10 milhões por ano para sustentação         | 1-3 Quadriênios |
| XVII Projetos das Caixas de Retenção em Lotes Privados                                | 5-20 milhões para implementação + 5-10 milhões por ano para sustentação         | 1-2 Quadriênios |
| XVIII Aprimoramento do Sistema de Cadastro de Intervenções por parte do Município     | 5-10 milhões para implementação + 3-5 milhões por ano para sustentação          | 1-4 Quadriênios |
| XIX Obras de Urbanismo Social   | 5-15 bilhões  | 1-4 Quadriênios |
| XX Controle da Execução do Plano  | Não possui custos   | 1-4 Quadriênios |

**GESTÃO  
25-28**

**PLANO  
DIRETOR DE  
DRENAGEM -  
PDD**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

## **2ª edição do PDD/ Plano de Ações**

Desenvolvido em parceria com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH) da USP, o Plano de Ações reúne as principais obras de drenagem previstas para a cidade. Um dos pontos de destaque é o sistema de hierarquização de projetos e propostas existentes.

### **Investimento**

Aproximadamente R\$ 8,7 bilhões

### **Cronograma**

4 quadriênios (16 anos)

### **Abrangência**

- 97 importantes obras estruturantes do sistema de drenagem do município
- Acréscimo de 5,1 milhões de m<sup>3</sup> na capacidade de reservação do sistema de drenagem
- se estendem por 53 mil metros de rios e córregos, e abrangem 33 bacias hidrográficas

**GESTÃO  
25-28**

**PLANO  
DIRETOR DE  
DRENAGEM -  
PDD**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

| Critério                          | Subcritério  |
|-----------------------------------|--|
| Construtivo                       | Prazo estimado para a construção (meses)                             |
|                                   | Grau de transtorno durante a fase das obras (tipologia)              |
| Econômico                         | Custo de implantação (R\$)   |
|                                   | Custo de operação e manutenção (grau)                                |
|                                   | Custo de desapropriação/custo da obra (%)                            |
| Social                            | População a ser reassentada (remoções)                               |
|                                   | Vulnerabilidade social (IPVS)  |
|                                   | População residente na área de redução da mancha de inundação (hab.) |
| Ambiental                         | Ganho ambiental (grau)   |
|                                   | Custo ambiental/custo da obra (%)                                    |
|                                   | Grau de complexidade do licenciamento ambiental                      |
| Danos evitados                    | Redução da mancha de inundação (km <sup>2</sup> )                    |
|                                   | Grau de importância das vias a serem protegidas                      |
|                                   | Grau de importância das edificações a serem protegidas               |
| Repercussão da intervenção        | Repercussão de acordo com a opinião pública                          |
| Vulnerabilidade técnica           | Fase de projeto  |
|                                   | Suscetibilidade a falhas (grau)                                      |
| Impactos na infraestrutura urbana | Uso múltiplo da área   |





# PLANO DIRETOR DE DRENAGEM - PDD



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

| Ranking<br>2ª ed. | Intervenção   |                        |                  |                  | Custos |                |
|-------------------|---|------------------------|------------------|------------------|--------|----------------|
|                   | Nome da intervenção 2ª ed.  | Córrego                | Situação Jan/202 | Previsão entrega | Obra   |                |
| 1                 | Reservatório Torresmo (RLJ-4)                                     | Lajeado                | 2. Estudos       | 2028             | R\$    | 125.550.000,00 |
| 2                 | Canalização do Glicério   | Glicério               | 1. Não iniciada  | 2028             | R\$    | 37.000.000,00  |
| 3                 | Reservatório Carumbé (CR 01)                                      | Carumbé                | 2. Estudos       | 2028             | R\$    | 48.000.000,00  |
| 4                 | Reservatório Guaraú   | Cabuçu de Baixo/Guaraú | 1. Não iniciada  | 2028             | R\$    | 6.200.000,00   |
| 5                 | Reservatório ACL-03   | Aclimação              | 1. Não iniciada  | 2029             | R\$    | 91.400.000,00  |
| 6                 | Túneis Xavier Kraus e Queiroz Filho                               | Vila Leopoldina        | 1. Não iniciada  | 2029             | R\$    | 224.100.000,00 |
| 7                 | Canalização Oliveira Lima   | Oliveira Lima          | 1. Não iniciada  | 2029             | R\$    | 2.850.000,00   |
| 8                 | Canalização Freitas   | Freitas                | 2. Estudos       | 2029             | R\$    | 68.650.000,00  |
| 9                 | Canalização Lins de Vasconcelos e Luís Gama                       | Aclimação              | 1. Não iniciada  | 2029             | R\$    | 20.800.000,00  |
| 10                | Pq. linear Tapera   | Tapera                 | 3. Projeto       | 2029             | R\$    | 28.350.000,00  |
| 11                | Pôlder Ceagesp (PVL-01)   | Rio Pinheiros          | 1. Não iniciada  | 2029             | R\$    | 77.350.000,00  |
| 12                | Adequação do extravasor Lagoa Aliperti                            | Ipiranga               | 1. Não iniciada  | 2027             | R\$    | 10.000,00      |
| 13                | Reservatório Mooca 4  | Mooca                  | 1. Não iniciada  | 2030             | R\$    | 198.000.000,00 |
| 14                | Reservatório Pirajuçara 5 (RPI-21)                                | Pirajuçara             | 1. Não iniciada  | 2030             | R\$    | 851.400.000,00 |
| 15                | Pq. linear Pirajuçara (PPI-1)                                     | Pirajuçara             | 1. Não iniciada  | 2030             | R\$    | 96.500.000,00  |
| 16                | Reservatório Itaquera-Mirim (RIM-1) + canalização                 | Itaquera-Mirim         | 2. Estudos       | 2030             | R\$    | 295.800.000,00 |
| 17                | Túnel de desvio Pirajuçara-Mirim                                  | Pirajuçara-Mirim       | 1. Não iniciada  | 2030             | R\$    | 74.350.000,00  |
| 18                | Reservatório Itaim (ZL)   | Itaim Leste            | 2. Estudos       | 2030             | R\$    | 365.400.000,00 |
| 19                | Galeria Cacacareco  | Cacareco               | 1. Não iniciada  | 2030             | R\$    | 26.800.000,00  |
| 20                | Reservatório ACL-06   | Glicério               | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 45.000.000,00  |
| 21                | Reservatório Bananal  | Bananal                | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 35.000.000,00  |
| 22                | Pq. linear Jaguaré 2 (JG 02)                                      | Jacarezinho            | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 68.300.000,00  |
| 23                | Reservatório Lauzane  | Lauzane                | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 180.000.000,00 |
| 24                | Reservatório Avanhandava (RAN-1) + substituição de galerias e rev | Saracura               | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 58.600.000,00  |
| 25                | Reservatório Pç. Portugal (RVII-3) + galeria de reforço           | Braço II               | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 105.500.000,00 |
| 26                | Reservatório (RLJ-1)  | Lajeado                | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 24.000.000,00  |
| 27                | Alteamento de pontes no Itaim/Jaguaráé (x2)                       | Itaim/Jaguaráé         | 1. Não iniciada  | 2031             | R\$    | 4.000.000,00   |
| 28                | Reservatório Gastão Vidigal (RVL-04A)                             | Vila Leopoldina        | 1. Não iniciada  | 2032             | R\$    | 21.600.000,00  |
| 29                | Reservatório Mooca 5  | Mooca                  | 1. Não iniciada  | 2032             | R\$    | 207.000.000,00 |
| 30                | Reservatório Zavuvus 2 (RZ-2)                                     | Zavuvus                | 4. Obra          | 2032             | R\$    | 234.000.000,00 |



**GESTÃO  
25-28**

**PLANO  
DIRETOR DE  
DRENAGEM -  
PDD**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

|    | Intervenção  |                          |                 |      | Custos             |
|----|--|--------------------------|-----------------|------|--------------------|
| 31 | Pôlderes do Ipiranga, dique, galerias de reforço e revestimento de | Ipiranga/Tamanduateí     | 1. Não iniciada | 2032 | R\$ 258.700.000,00 |
| 32 | Reservatório Aricanduva IV (RAR-4)                                 | Aricanduva               | 1. Não iniciada | 2032 | R\$ 46.000.000,00  |
| 33 | Canalização Diniz  | Diniz                    | 3. Projeto      | 2032 | R\$ 10.200.000,00  |
| 34 | Reservatório Franquinho (RFR-02)                                   | Franquinho               | 2. Estudos      | 2032 | R\$ 11.200.000,00  |
| 35 | Praça de infiltração e retenção 9 de Julho                         | Saracura-Mirim           | 3. Projeto      | 2032 | R\$ 9.100.000,00   |
| 36 | Reservatório Racine (RVL-01)                                       | Vila Leopoldina          | 1. Não iniciada | 2033 | R\$ 54.000.000,00  |
| 37 | Reservatório Jacupeval (RJP 01) + canalização                      | Jacupeval                | 2. Estudos      | 2033 | R\$ 25.200.000,00  |
| 38 | Reservatório Cordeiro 6 (RCO-6) + caixa de equalização             | Cordeiro                 | 3. Projeto      | 2033 | R\$ 127.000.000,00 |
| 39 | Pôlder ACD Belini/Corujas + galeria de reforço                     | Belini/Corujas/Pinheiros | 1. Não iniciada | 2033 | R\$ 66.400.000,00  |
| 40 | Reservatório Abegoária   | Braço I                  | 4. Obra         | 2033 | R\$ 47.900.000,00  |
| 41 | Reservatório 14 Bis (RAN-3) + substituição de galerias             | Saracura-Mirim           | 1. Não iniciada | 2033 | R\$ 69.000.000,00  |
| 42 | Galeria de reforço – Água Funda                                    | Ipiranga                 | 1. Não iniciada | 2033 | R\$ 7.600.000,00   |
| 43 | Adequação do Lago Ibirapuera                                       | Sapateiro                | 1. Não iniciada | 2033 | R\$ 67.000.000,00  |
| 44 | Reservatório Jacu 1 (RJC 01)                                       | Jacu                     | 1. Não iniciada | 2034 | R\$ 166.400.000,00 |
| 45 | Canalização Paciência - Montante                                   | Paciência                | 1. Não iniciada | 2034 | R\$ 30.156.840,00  |
| 46 | Reservatório Cordeiro 5 (RCO-5) + caixa de equalização             | Cordeiro                 | 3. Projeto      | 2034 | R\$ 123.400.000,00 |
| 47 | Pôlder Jd. Pantanal  | São Martinho             | 2. Estudos      | 2034 | R\$ 96.500.000,00  |
| 48 | Túnel-reservatório Rouxinol + galerias de interligação             | Uberabinha               | 2. Estudos      | 2034 | R\$ 236.600.000,00 |
| 49 | Canalização Horto  | Horto                    | 3. Projeto      | 2034 | R\$ 13.800.000,00  |
| 50 | Reservatório Bandeira (RAN-2) + substituição de galerias           | Saracura                 | 2. Estudos      | 2034 | R\$ 99.000.000,00  |
| 51 | Reservatório Tabatinguera + canalização                            | Tabatinguera             | 1. Não iniciada | 2034 | R\$ 126.200.000,00 |
| 52 | Reativação de galeria existente Braço I                            | Braço I                  | 1. Não iniciada | 2035 | R\$ 500.000,00     |
| 53 | Reservatório ACL-05  | Oliveira Lima            | 1. Não iniciada | 2035 | R\$ 35.300.000,00  |
| 54 | Pôlder Belini + galeria de reforço                                 | Belini                   | 1. Não iniciada | 2035 | R\$ 68.600.000,00  |
| 55 | Reservatório Tiquatira (RTQ-02) + convivência com a inundação      | Tiquatira                | 2. Estudos      | 2035 | R\$ 237.750.000,00 |
| 56 | Ampliação do canal do Ipiranga + adequação de sete travessias      | Ipiranga                 | 1. Não iniciada | 2035 | R\$ 141.600.000,00 |
| 57 | Pôlder Corujas + galeria de reforço                                | Corujas                  | 1. Não iniciada | 2035 | R\$ 36.600.000,00  |
| 58 | Reservatório Tremembé 6 (RTR-06)                                   | Piqueri                  | 3. Projeto      | 2035 | R\$ 96.000.000,00  |
| 59 | Reservatório Tremembé 2 (RTR-02) + canalização Cantareira          | Cantareira               | 3. Projeto      | 2035 | R\$ 75.600.000,00  |
| 60 | Galeria de desvio Luz  | Luz                      | 1. Não iniciada | 2036 | R\$ 22.200.000,00  |

**GESTÃO  
25-28**

**PLANO  
DIRETOR DE  
DRENAGEM -  
PDD**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

|    | Intervenção  |                        |                 |      | Custos |                |
|----|--|------------------------|-----------------|------|--------|----------------|
| 61 | Reservatório Zavuvus 3 (RZ-3)                                      | Zavuvus                | 3. Projeto      | 2036 | R\$    | 198.000.000,00 |
| 62 | Reservatório Jaguaré 1 (JG 01)                                     | Jagaré                 | 1. Não iniciada | 2036 | R\$    | 147.200.000,00 |
| 63 | Canalização da Albina Barbosa                                      | Aclimação              | 1. Não iniciada | 2036 | R\$    | 34.000.000,00  |
| 64 | Galeria da Josephina Martinelli e Cafezais                         | Cordeiro               | 1. Não iniciada | 2036 | R\$    | 17.750.000,00  |
| 65 | Canalização Paraguaçu  | Paraguaçu              | 1. Não iniciada | 2036 | R\$    | 28.750.000,00  |
| 66 | Galeria de reforço Cintra  | Cintra                 | 1. Não iniciada | 2036 | R\$    | 1.750.000,00   |
| 67 | Reservatório Cassandoca  | Cassandoca             | 3. Projeto      | 2036 | R\$    | 216.000.000,00 |
| 68 | Reservatório Pç. Irmãos Karmam (RSU-4)                             | Sumaré                 | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 63.000.000,00  |
| 69 | Reservatório Vinte e Três de Maio (RAN-5) + substituição de galeri | Itororó                | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 70.600.000,00  |
| 70 | Reservatório MAM - Ibirapuera (RSP-06) + galerias de reforço       | Sapateiro              | 2. Estudos      | 2037 | R\$    | 114.200.000,00 |
| 71 | Canalização Itaim  | Itaim                  | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 30.000.000,00  |
| 72 | Reservatório Itaquera (RIQ-2)                                      | Itaquera               | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 268.000.000,00 |
| 73 | Reservatório Caiubi (RSU-3)  | Sumaré                 | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 86.400.000,00  |
| 74 | Reservatório Itaim 2 (IT 02)                                       | Itaim                  | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 70.400.000,00  |
| 75 | Reservatório Rapadura  | Rapadura               | 1. Não iniciada | 2037 | R\$    | 81.000.000,00  |
| 76 | Reservatório R. Roma   | Tiburtino              | 1. Não iniciada | 2038 | R\$    | 41.400.000,00  |
| 77 | Reservatório Venâncio Aires (RAP-1)                                | Água Preta             | 1. Não iniciada | 2038 | R\$    | 144.000.000,00 |
| 78 | Canalização Cupecê   | Cupecê                 | 1. Não iniciada | 2038 | R\$    | 11.500.000,00  |
| 79 | Reservatório Pç. Manuel Vaz de Toledo (RSP-03)                     | Sapateiro              | 2. Estudos      | 2038 | R\$    | 58.100.000,00  |
| 80 | Pôlder Mercado   | Anhangabaú/Tamanduateí | 2. Estudos      | 2038 | R\$    | 19.200.000,00  |
| 81 | Reservatório João Moura (RVII-1)                                   | Braço II               | 1. Não iniciada | 2038 | R\$    | 36.000.000,00  |
| 82 | Reservatório Tremembé 7 (RTR-07) + canalização Tremembé            | Tremembé               | 3. Projeto      | 2038 | R\$    | 32.200.000,00  |
| 83 | Reservatório Cordeiro 4 (RCO-4) + caixa de equalização             | Cordeiro               | 3. Projeto      | 2038 | R\$    | 94.600.000,00  |
| 84 | Galeria Canumã   | Canumã                 | 1. Não iniciada | 2039 | R\$    | 5.200.000,00   |
| 85 | Reservatório Vila Aurora + galerias de reforço                     | Vila Aurora            | 2. Estudos      | 2039 | R\$    | 120.000.000,00 |
| 86 | Reservatório Pç. Soichiro Honda (RSP-04)                           | Sapateiro              | 2. Estudos      | 2039 | R\$    | 129.900.000,00 |
| 87 | Reservatório Moinho Velho 2  | Moinho Velho           | 1. Não iniciada | 2039 | R\$    | 80.000.000,00  |
| 88 | Galeria do Arrieiro  | Arrieiro               | 1. Não iniciada | 2039 | R\$    | 8.000.000,00   |
| 89 | Galeria Verde Braço I  | Braço I                | 1. Não iniciada | 2039 | R\$    | 19.250.000,00  |
| 90 | Reservatório Av. Dr. Dante Pazzanese (RSP-05)                      | Caaguaçu               | 2. Estudos      | 2039 | R\$    | 57.600.000,00  |

GESTÃO  
25-28

PLANO  
DIRETOR DE  
DRENAGEM -  
PDD



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

|    | Intervenção  |            |                 |      | Custos             |
|----|--|------------|-----------------|------|--------------------|
| 91 | Túnel de desvio Morro do S   | Morro do S | 1. Não iniciada | 2039 | R\$ 230.600.000,00 |
| 92 | Canalização Água Podre   | Água Podre | 1. Não iniciada | 2040 | R\$ 37.500.000,00  |
| 93 | Reservatório Pç. Rio dos Campos (RAP-3) + galeria de reforço e aum | Água Preta | 1. Não iniciada | 2040 | R\$ 111.600.000,00 |
| 94 | Reservatório Mario Cardim (RSP-01)                                 | Sapateiro  | 2. Estudos      | 2040 | R\$ 9.000.000,00   |
| 95 | Reservatório Tremembé 4 (RTR-04)                                   | Tremembé   | 3. Projeto      | 2040 | R\$ 20.000.000,00  |
| 96 | Reservatório Tietê (RVII-7)  | Braço II   | 1. Não iniciada | 2040 | R\$ 18.000.000,00  |
| 97 | Reservatório Água Preta Cabuçu (AP 01)                             | Água Preta | 1. Não iniciada | 2040 | R\$ 18.000.000,00  |

**GESTÃO  
25-28**

## MOBILIDADE



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### Obras e projetos de destaque

- BRT Radial e Aricanduva – em obras / em licitação
- Duplicação Av. Sen. Teotônio Vilela – em andamento
- Req. do corredor da Av. Interlagos – em andamento
- Req. do corredor da Av. Imirim – em andamento
- Req. do corredor da Estrada de Itapeceira – em andamento
- Req. do corredor da Av. Amador Bueno – em andamento
- Projeto Graúna-Gaivotas – em andamento
- Term. Itaquera – em andamento
- Proj. req. do corredor Santo Amaro/João Dias - em andamento
- Viário Perus – em projeto
- Viário e drenagem da região de Santana – em estudo
- Req. do Triângulo e Quadrilátero – em obras/ em licitação
- Ruas Agrimensor Sugaya e Cristóvão Salamanca – em andamento
- Ligação norte-sul, Av. Brás Leme a estação da Luz – licitação projeto
- Av. Almirante Delamare – em andamento
- Duplicação Ponte Jurubatuba - em andamento
- Ligação Av. Dep. Aristodemo Pinoti e Av. Imperador – em projeto
- Passagem em desnível e complexo Viário Ragueb Chohfi – em projeto
- Terminal de Ônibus Urbano Itaim Paulista – em projeto

**GESTÃO  
25-28**

## OPERAÇÕES URBANAS



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Água Branca**

- Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade – contrato suspenso
- Ligação Viária Pirituba-Lapa – em andamento
- Drenagem da bacia do C. Água Branca – suspensão solicitada

### **Água Espraiada**

- Prolongamento da Av. Chucri Zaidan – em obras
- Revitalização da Av. Roberto Marinho – em estudo

### **Faria Lima**

- Requalificação da Av. Santo Amaro – em obras
- Rua Eugênio de Medeiros, Rua Butantã, Rua Costa Carvalho, Rua Pascoal Bianco e Rua Amaro Cavalheiro- em rescisão

**GESTÃO  
25-28**

## UNIDADES EDUCACIONAIS



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Muros de arrimo**

- Em andamento: 1

### **Manutenção**

- Em andamento: 439
- Em licitação: 194

### **Reforma CEUs**

- Em andamento: 14
- Em licitação: 14

### **Novos CEUs**

- Em licitação: 6

### **Cobertura de quadra**

- Em andamento: 1

### **Pista de skate**

- Em licitação: 3

### **Novas unidades**

- Em andamento: 17
- Em licitação: 6

### **Teatro/Planetário**

- Em licitação: 1

Portarias: 03/21, 04/22, 06/22, 03/23, 01/24 e ATA

# GESTÃO 25-28

## OAEs



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

| PANORAMA GERAL  | U.E. | TOTAL |
|---|------|-------|
| Inspeções rotineiras – realizadas                       | 843  | 2.099 |
| Inspeções rotineiras – andamento                        | 924  |       |
| Inspeções rotineiras – planejadas                       | 306  |       |
| Inspeções rotineiras <b>túneis</b> – planejadas         | 26   |       |
| Inspeções especiais – realizadas                        | 309  | 1.271 |
| Inspeções especiais – andamento                         | 62   |       |
| Inspeções especiais – planejadas                        | 848  |       |
| Inspeções especiais <b>túneis</b> civil – andamento     | 26   |       |
| Inspeções especiais <b>túneis</b> sistemas – planejadas | 26   |       |
| Obras de recuperação e reforço – realizadas             | 128  |       |
| Obras de recuperação e reforço – andamento              | 86   |       |
| Obras de recuperação e reforço – planejadas             | 335  |       |
| Obras de recuperação funcional – realizadas             | 38   | 331   |
| Obras de recuperação funcional – andamento              | 87   |       |
| Obras de recuperação funcional – planejadas             | 206  |       |



## NOVAS ATAS GALERIAS



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Previsão de investimento**

R\$ 2,2 bilhões

### **Serviços**

Limpeza preliminar, inspeção, diagnóstico, prognóstico com análise técnica e execução dos serviços de recuperação das galerias e canais

### **Extensão**

- Galerias de grandes dimensões: aprox. 326 km
- Canais: aprox. 50 Km

### **Grupo A**

Dividido em 4 agrupamentos onde há serviço continuado de limpeza preliminar, inspeção instrumentaliza e diagnóstico, prognóstico com análise técnica e orçamento de recuperação.

### **Grupo B**

Dividido em 16 agrupamentos. Executa a recuperação a partir das Ordens de serviço emitidas.



**GESTÃO  
25-28**

**NOVAS ATAS  
OAEs  
PRÓPRIOS**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### OAEs

**Previsão de investimento**  
R\$ 2 bilhões

**Serviços**  
Recuperação funcional

**Estruturas atendidas**  
1.193 OAEs

### PRÓPRIOS MUNICIPAIS

**Previsão de investimento**  
R\$ 1,2 bilhão

**Serviços**  
Manutenções e reparos de 2º  
escalão

**Órgãos**  
A ata pode ser aderida por  
todos os entes da PMSP

**100 DIAS**

Ações previstas



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**100 DIAS**

**AÇÕES  
PREVISTAS**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **SIURB**

#### **44 ações, sendo:**

- 32 licitações – 15 concluídas e 3 suspensas
- 11 inícios de obras – meta 100% atingida
- 1 entrega de projeto

### **SPOBRAS**

#### **46 ações, sendo:**

- 15 conclusões de obras – Vdt. Dante Delmanto entregue
- 1 início de contrato – Nova Marg. Pinheiros suspensa pelo TCM
- 30 inícios de obra – Av. Santo Amaro iniciada / 6 novos CEUs suspensos pelo TCM

# MULHERES NA CONSTRUÇÃO

Programa de empreendedorismo



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS



MULHERES NA  
CONSTRUÇÃO

## PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

### **Objetivo**

Prepara as mulheres para atuarem na construção civil, promovendo a capacitação das competências técnicas, gerenciais e comportamentais. Promover cursos de qualificação ou de requalificação no setor da construção para o público feminino.

### **Concepção do programa**

- Necessidade de mão de obra, disponibilidade e desejo das mulheres empreendedoras
- Promover a qualificação e aumentar a produtividade através de novas oportunidades de trabalho e renda
- Aproveitar oportunidades de mercado e empreender de forma preparada e planejada no setor da construção

### **Parceria**

Centro Democrático Nordestino - CDN

## DEBATE

### Pontos Importantes de esclarecimento:

- Perspectivas para 2025
  - Empenhos de obras
  - Novas licitações
  - Novos projetos
- Desenvolvimento dos trabalhos
  - Estrutura da SIURB / SPObras
  - Andamento dos contratos
- Trabalho com as entidades



Scaneie o QR Code abaixo para entrar em contato com a SIURB,  
acessar nosso site e nossas redes sociais.



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS
